



# QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Software Project Management

ThS Nguyễn Việt Dũng

[dungnv1@ptit.edu.vn](mailto:dungnv1@ptit.edu.vn)



# Quản lý phạm vi dự án



# Mục tiêu

- Hiểu bản chất của Lập Kế Hoạch (Planning) trong quản lý dự án
- Biết các hoạt động chính trong quá trình lập kế hoạch
- Đi sâu vào các hoạt động lập kế hoạch trong Quản Lý Phạm Vi (Scope Management)

Bạn đang cần chuẩn bị cho chuyến **du lịch Nhật Bản** trong thời gian **6 ngày 5 đêm** cho nhóm **4 người**.

**?** Bạn sẽ làm gì trước khi đi?

## 1. Xác định điểm đến, những hoạt động sẽ & không làm

**Mục tiêu:** Chuyển đi phải bao gồm các điểm tham quan chính, ăn uống, mua sắm nhưng không quá căng thẳng.

- ✓ Điểm đến: Tokyo – Kyoto – Osaka.
- ✓ Hoạt động: Tham quan đền chùa, thưởng cảnh ngắm hoa anh đào, mua sắm, khám phá ẩm thực.
- ✓ Không bao gồm: Leo núi, trượt tuyết, tắm biển

## 2. Lên lịch trình chi tiết từng ngày

**Mục tiêu: Cân bằng giữa tham quan và nghỉ ngơi để không quá mệt.**

- |                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Chuẩn bị trước chuyến đi | 2. Ngày 1 – Đến Tokyo, khám phá Shibuya    |
| 1.1 Xin Visa                | 3. Ngày 2 – Tokyo Disneyland               |
| 1.2 Đặt vé máy bay          | 4. Ngày 3 – Di chuyển đến Kyoto            |
| 1.3 Đặt khách sạn           | 5. Ngày 4 – Osaka, Universal Studios       |
| 1.4 Mua JR Pass & SIM card  | 6. Ngày 5 – Shopping ở Dotonbori, về Tokyo |
| 1.5 Lên lịch trình chi tiết | 7. Ngày 6 – Bay về Việt Nam                |

### 3. Dự toán ngân sách

Mục tiêu: Không bị vượt ngân sách nhưng vẫn trải nghiệm đủ.

| Khoản mục           | Chi phí (VNĐ/người) | Ghi chú                        |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Vé máy bay          | 10.000.000          | Khứ hồi VietJetAir             |
| Khách sạn           | 5.000.000           | 5 đêm, 3 sao                   |
| Di chuyển           | 3.000.000           | Thẻ JR, Taxi                   |
| Ăn uống             | 4.000.000           | 800.000/ngày                   |
| Vé tham quan        | 2.000.000           | Disneyland, Universal Studios  |
| Mua sắm & phát sinh | 3.000.000           | Quà lưu niệm, chi phí dự phòng |
| <b>Tổng cộng</b>    | <b>27.000.000</b>   |                                |

## 4. Xác định các tiêu chí, trải nghiệm mong muốn

Mục tiêu: Trải nghiệm du lịch đúng mong đợi, không bị rắc rối.

### Tiêu chí chất lượng

- ✓ Khách sạn gần ga tàu, sạch sẽ, có điểm đánh giá từ 8.5 trở lên.
- ✓ Di chuyển không mất quá 1 giờ giữa các điểm để tránh mệt mỏi.
- ✓ Trải nghiệm đủ ẩm thực, văn hóa và giải trí mà không quá vội vàng.



## 5. Phân công nhiệm vụ

Mục tiêu: Mọi người đều tham gia vào việc chuẩn bị, không ai bị quá tải.

 Phân công nhiệm vụ trong nhóm

- ✓ A đặt vé máy bay & khách sạn.
- ✓ B tìm hiểu lịch trình & điểm tham quan.
- ✓ C quản lý ngân sách chung.
- ✓ D phụ trách check-in & giao tiếp với người địa phương.

## 6. Lên phương án trao đổi, liên lạc

Mục tiêu: Cả nhóm luôn biết lịch trình và trao đổi thông tin nhanh chóng

 Công cụ liên lạc

- ✓ WhatsApp/Zalo: Nhóm chat chung để cập nhật.
- ✓ Google Docs: Chia sẻ kế hoạch chi tiết.
- ✓ Google Maps: Đánh dấu các địa điểm quan trọng.

## 7. Phương án dự phòng

Mục tiêu: Xử lý tốt các tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

 Những rủi ro có thể gặp & phương án xử lý

Trời mưa => Địa điểm tham quan trong nhà thay thế

Mất hành lý => Chia đồ ra nhiều vali, mua bảo hiểm

Lạc đường => Google Maps & địa chỉ khách sạn bằng tiếng Nhật

Không xin được Visa => ????

## 8. Xác định quà, địa điểm mua quà

Mục tiêu: Tiết kiệm thời gian & tiền bạc khi mua sắm.

 Danh sách mua sắm

- ✓ Mỹ phẩm Nhật (Don Quijote).
- ✓ Đồ điện tử (Akihabara).
- ✓ Quà lưu niệm (Kyoto, Asakusa).

## 9. Cân bằng mong muốn của mọi người

Mục tiêu: Đảm bảo mọi người trong nhóm đều vui vẻ.


 Làm sao để mọi người đều hài lòng?

- ✓ Hỏi ý kiến trước chuyển đi về những hoạt động họ thích.
- ✓ Dành thời gian linh hoạt để mỗi người có khoảng riêng.
- ✓ Lập danh sách “ưu tiên” & “có thể bỏ qua”

| Nội dung                         | Khía cạnh                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Xác định nội dung chuyển đi      | Quản lý Phạm vi (Scope Management)              |
| Lịch trình chuyển đi             | Quản lý Tiến độ (Schedule Management)           |
| Dự toán ngân sách                | Quản lý Chi phí (Cost Management)               |
| Xác định các tiêu chí            | Quản lý Chất lượng (Quality Management)         |
| Phân công trách nhiệm            | Quản lý tài nguyên (Resource Management)        |
| Lên phương án trao đổi, liên lạc | Quản lý Truyền thông (Communication Management) |
| Phương án dự phòng               | Quản lý Rủi ro (Risk Management)                |
| Xác định quà, địa điểm mua quà   | Quản lý Mua sắm (Procurement Management)        |
| Cân bằng mong muốn của mọi người | Quản lý Stakeholders (Stakeholder Management)   |

✅ **Lập kế hoạch tốt = Chuyển đi suôn sẻ, tiết kiệm chi phí & tránh rủi ro.**

✅ **Áp dụng 10 lĩnh vực quản lý dự án giúp bạn không bỏ sót bất cứ khía cạnh nào!**

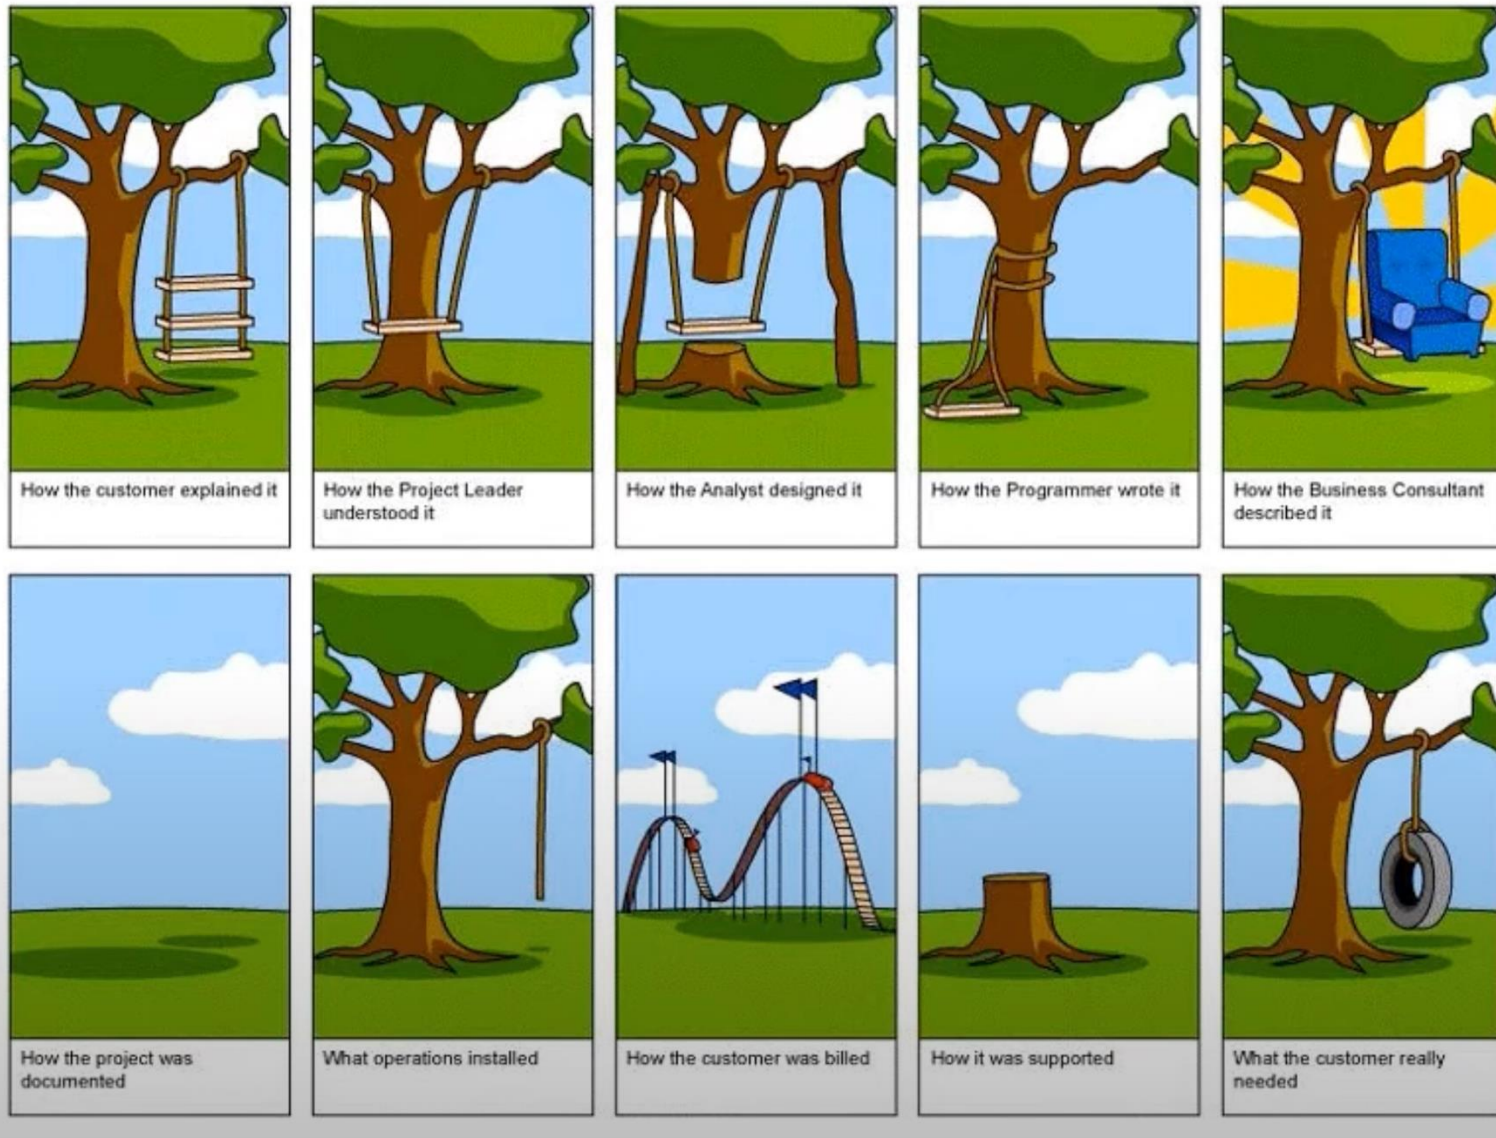


# Lập kế hoạch dự án

**Lập kế hoạch (Planning)** không phải chỉ là lên lịch trình!

Nó là quá trình xác định các công việc cần làm, cách làm, ai làm, khi nào làm, với tài nguyên nào, và làm thế nào để đảm bảo thành công.

=> Một bản kế hoạch cho dự án chính là một bản hướng dẫn việc thực thi dự án từ trước khi dự án được thực hiện để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả tốt theo mong muốn



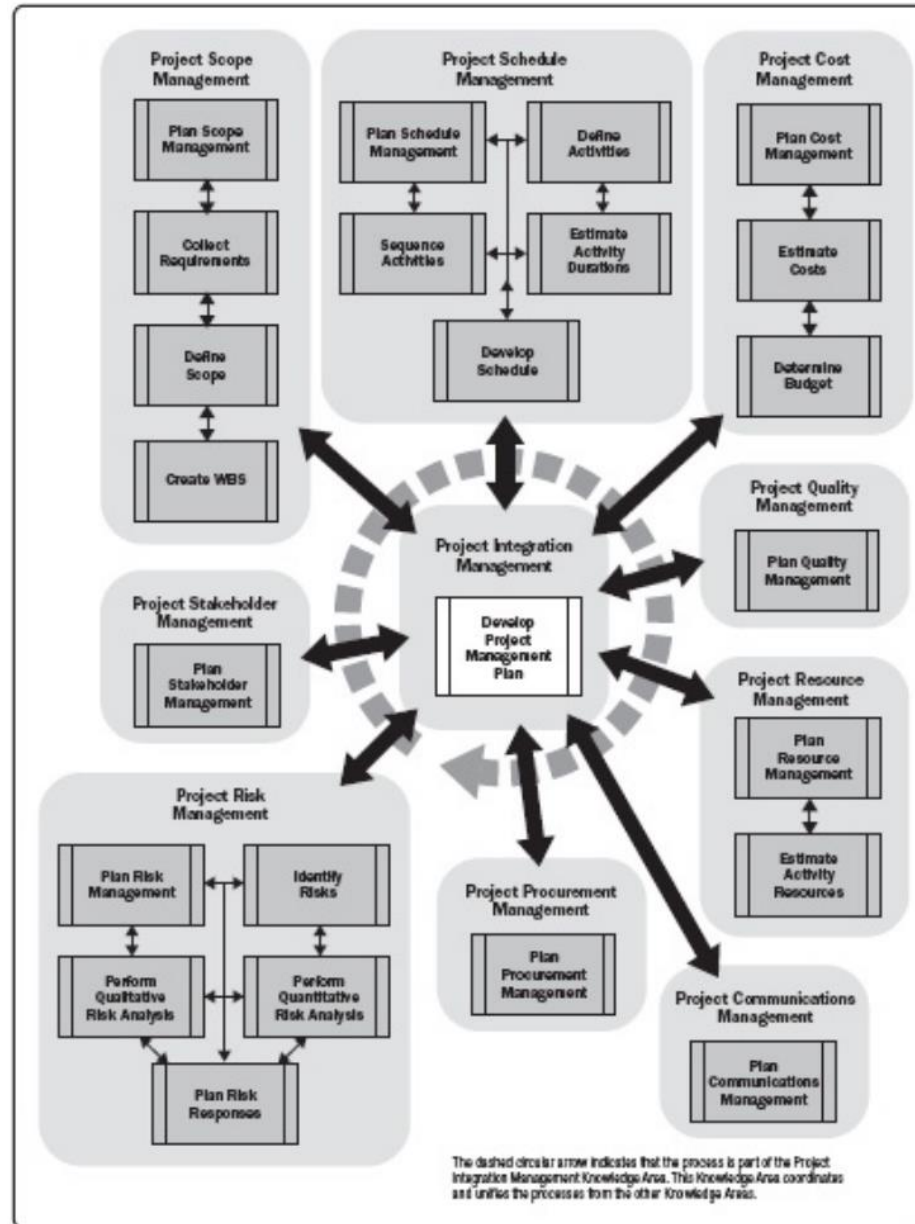

# Mục tiêu chính của lập kế hoạch

- Xác định đường đi rõ ràng cho dự án.
- Giúp quản lý rủi ro & tối ưu tài nguyên.
- Đảm bảo dự án chạy đúng hướng, tránh thay đổi mất kiểm soát

# Quản lý phạm vi

Quản lý phạm vi là làm rõ **sản phẩm cuối cùng** của dự án và quản lý phạm vi **các công việc cần thiết** để tạo ra sản phẩm đó

| Lập kế hoạch                                                                                                                                                                              | Giám sát và kiểm soát                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lập kế hoạch quản lý phạm vi</li><li>2. Thu thập yêu cầu</li><li>3. Định nghĩa phạm vi</li><li>4. Tạo cấu trúc phân rã công việc (WBS)</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kiểm tra phạm vi (Validate)</li><li>2. Kiểm soát phạm vi (Control)</li></ol> |

# Lập kế hoạch quản lý phạm vi

Lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án (Plan Scope Management) là quy trình tạo ra một **kế hoạch quản lý phạm vi dự án** trong đó mô tả cách phạm vi dự án được xác định, đánh giá, và kiểm soát như thế nào.

*=> Cung cấp hướng dẫn và định hướng để làm thế nào có thể tiến hành các hoạt động tiếp theo trong quản lý phạm vi*

# Lập kế hoạch quản lý phạm vi

## **Tài liệu kế hoạch quản lý phạm vi (Scope Management Plan)**

Kế hoạch quản lý phạm vi mô tả cách xác định, cách lập tài liệu, cách kiểm tra và kiểm soát phạm vi. Cụ thể như tiêu chuẩn khi thực hiện xác nhận tính hợp lệ của phạm vi (valid of scope), phương châm dùng để tạo WBS.


## **Tài liệu kế hoạch quản lý yêu cầu (Requirements Management Plan)**

Kế hoạch quản lý yêu cầu là một tài liệu mô tả cách thu thập và sắp xếp các yêu cầu của khách hàng. Chỉ định cách thức và thời điểm thu thập các yêu cầu của khách hàng.

# Thu thập yêu cầu

Là quy trình xác định, lập tài liệu, quản lý các yêu cầu và mong muốn của các bên liên quan (project stakeholder) nhằm đạt được mục tiêu dự án.

*=> Cung cấp cơ sở cho việc định nghĩa và quản lý phạm vi dự án bao gồm cả phạm vi sản phẩm.*

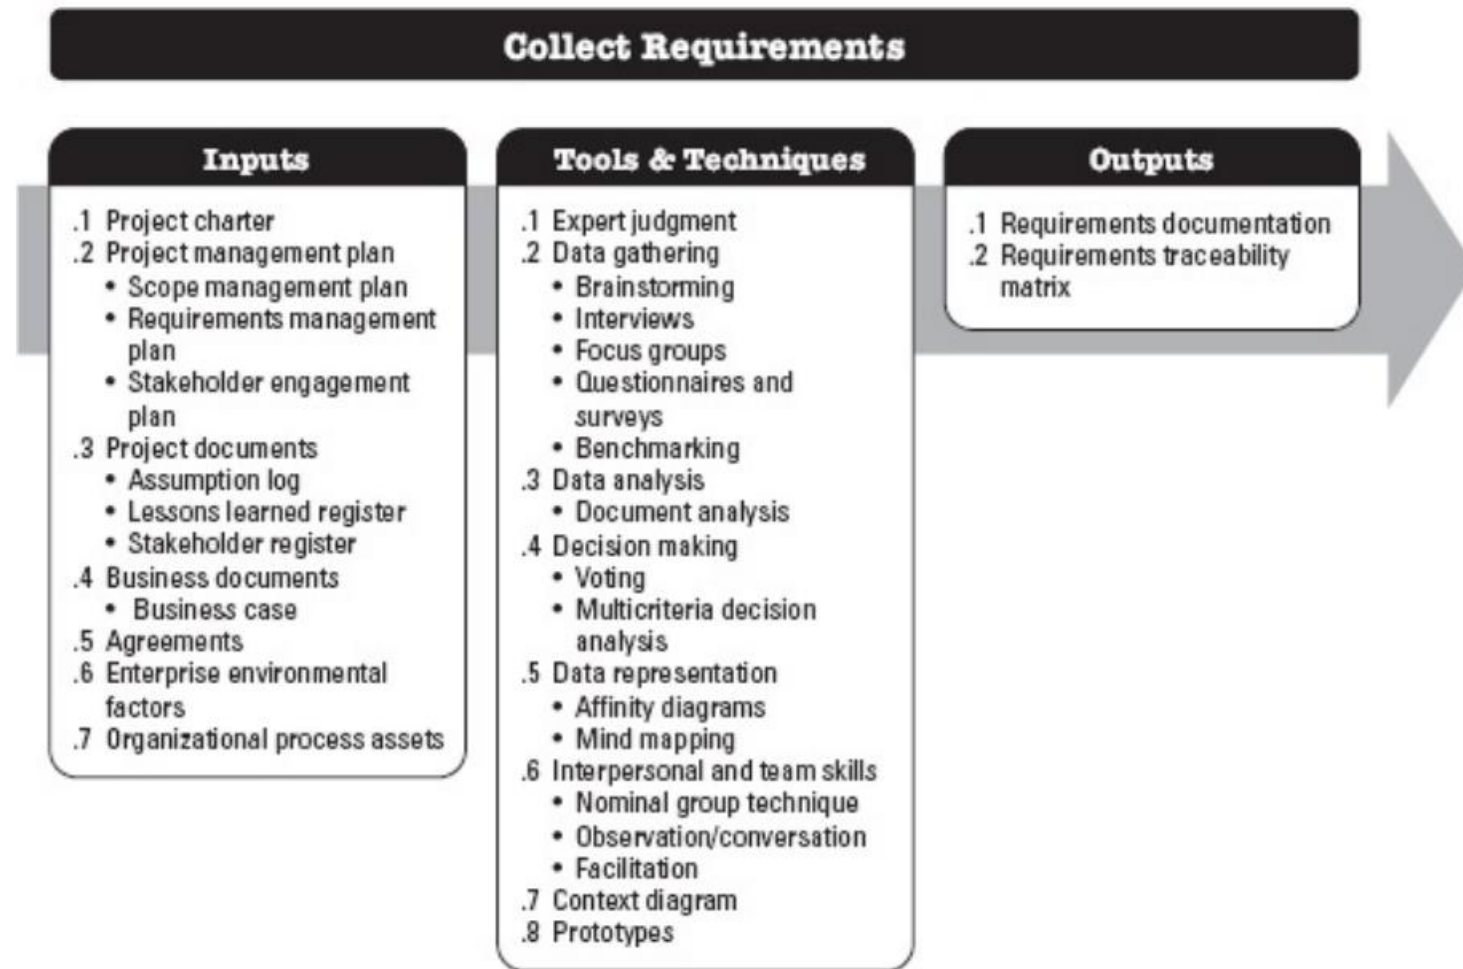


# Định nghĩa phạm vi

Là quy trình xác định phạm vi của dự án và sản phẩm chi tiết hơn dựa trên yêu cầu thu thập được từ khách hàng.

*=> Mô tả dự án, sản phẩm hay những giới hạn của kết quả bằng việc định nghĩa những yêu cầu nào là thuộc phạm vi dự án và những yêu cầu nào nằm ngoài phạm vi dự án.*



# Định nghĩa phạm vi

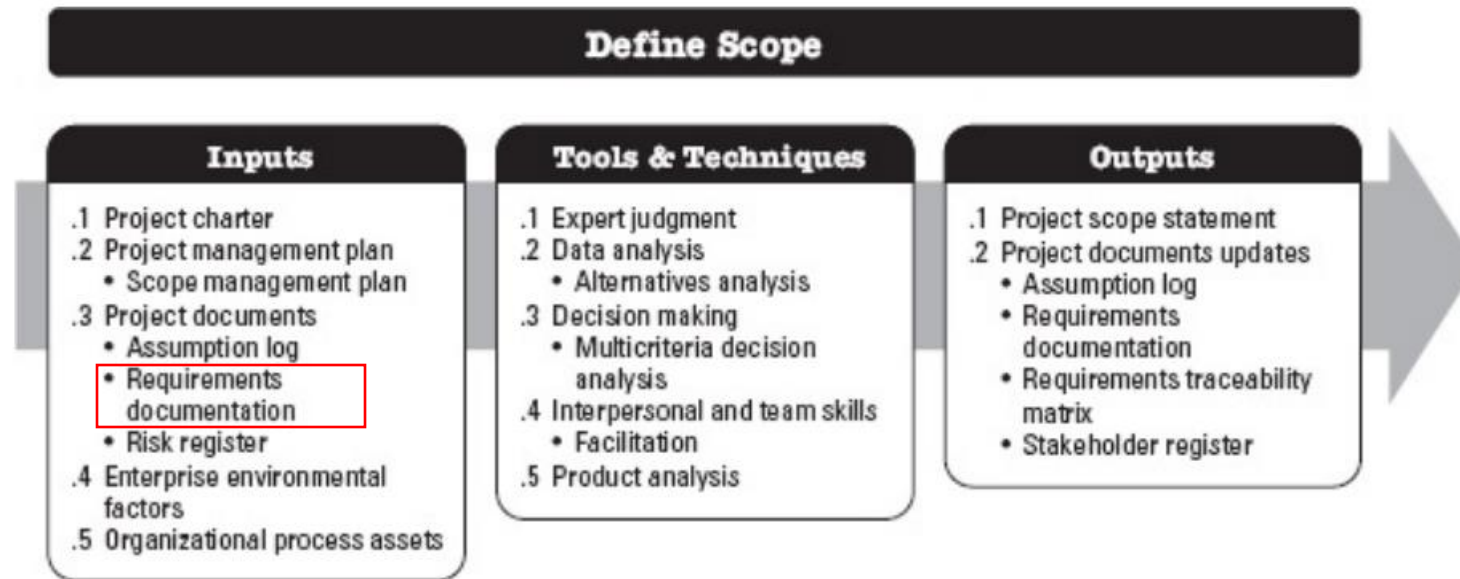


# Tạo cấu trúc phân rã công việc


Là quy trình chia nhỏ sản phẩm bàn giao và công việc dự án thành những phần có thể quản lý được.

=> Cung cấp một cái nhìn có cấu trúc về những sản phẩm mà dự án sẽ bàn giao.

# Tạo cấu trúc phân rã công việc

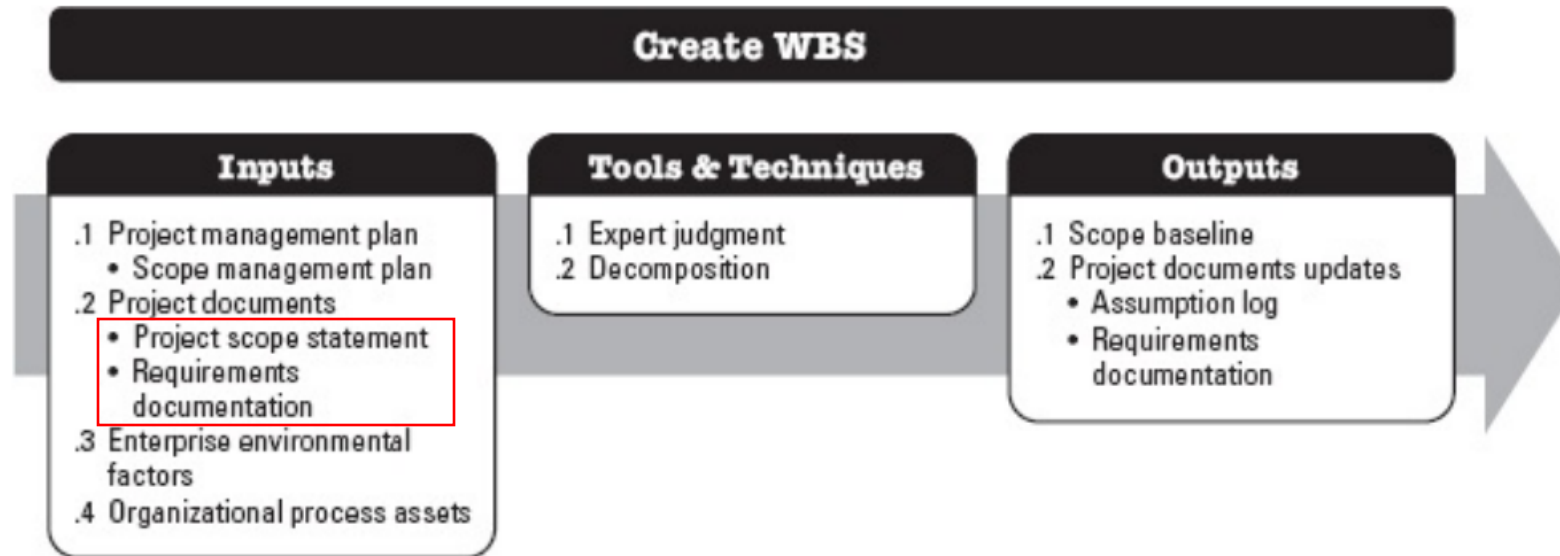


# Tạo cấu trúc phân rã công việc

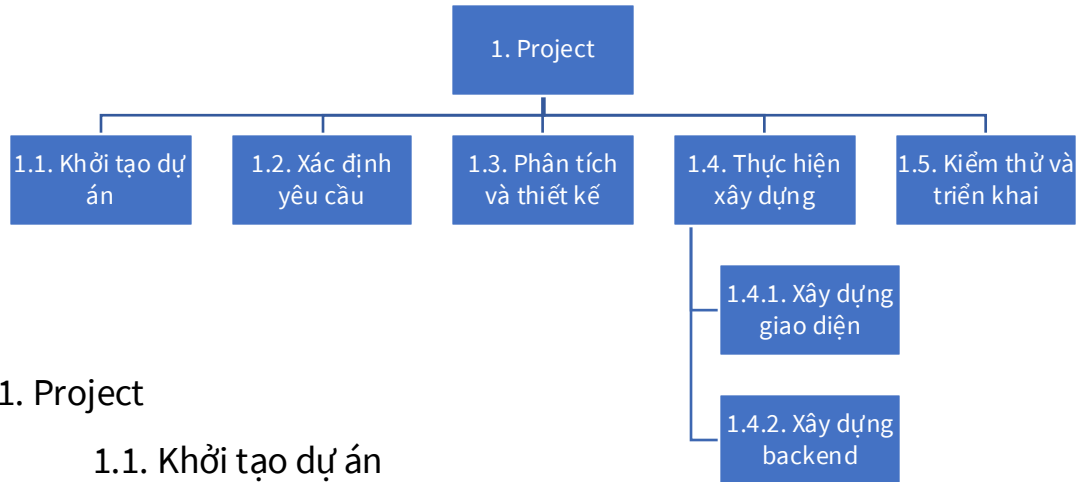

## 1. Project

- 1.1. Khởi tạo dự án
- 1.2. Xác định yêu cầu
- 1.3. Phân tích và thiết kế
- 1.4. Thực hiện xây dựng
  - 1.4.1. Xây dựng giao diện
  - 1.4.2. Xây dựng backend
- 1.5. Kiểm thử và triển khai

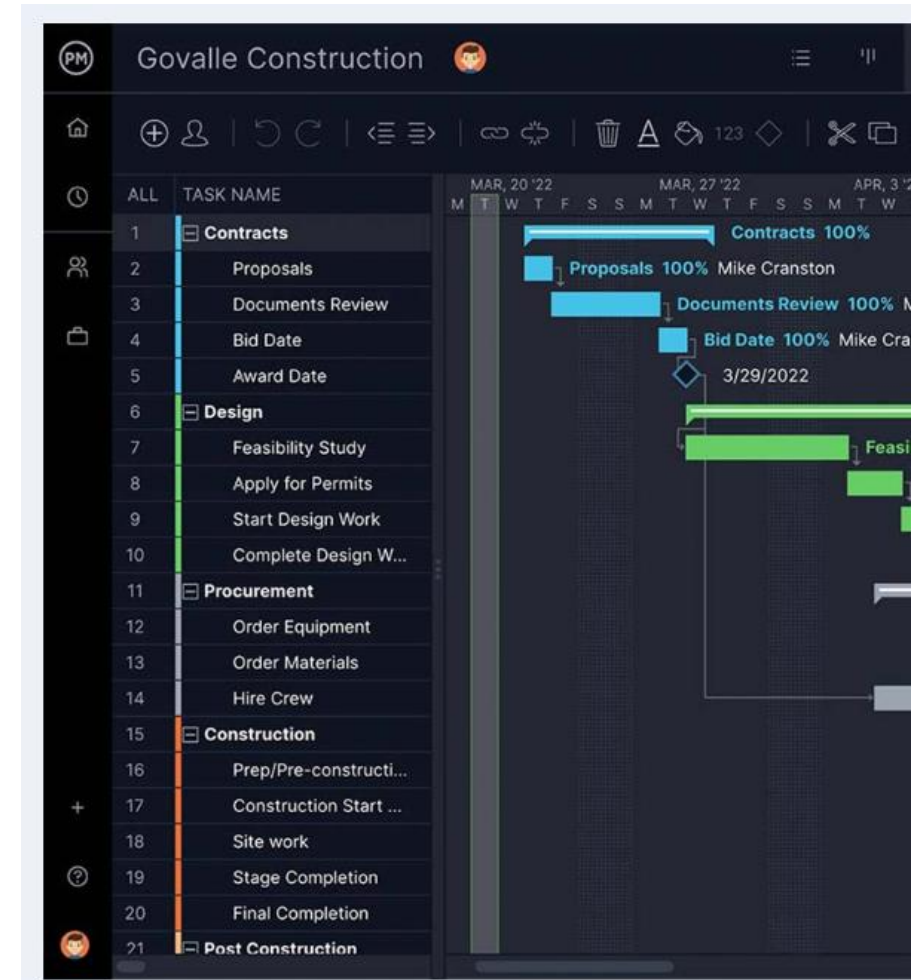

# Tạo cấu trúc phân rã công việc

WBS có nhiều tiêu chí để phân loại

- Phân loại theo **tiến trình**: Thu thập yêu cầu, Phân tích, ...
- Phân loại theo **sản phẩm**: Quản lý danh mục, Quản lý khóa học, ...
- **Kết hợp** 2 loại trên

# Tạo cấu trúc phân rã công việc

- **100% Rule:** Tổng tất cả các công việc ở cấp dưới phải bao quát toàn bộ phạm vi của cấp trên.
- **Mutually Exclusive:** Các Work Package không được trùng lặp nhiệm vụ.
- **Deliverable Oriented:** WBS nên tập trung vào đầu ra, không phải quá trình thực hiện.

# Tạo cấu trúc phân rã công việc

## Các cấp độ của WBS:

- **Level 1:** Dự án tổng thể.
- **Level 2:** Các pha hoặc deliverables chính.
- **Level 3:** Các công việc chi tiết hơn trong từng pha.
- **Level n:** Tiếp tục phân chia cho đến khi đạt được mức độ chi tiết mong muốn.

# Work Package

**Work Package** là đơn vị **mức thấp nhất trong Work Breakdown Structure (WBS)**. Một **Work Package** đại diện cho **một nhóm công việc cụ thể**, có thể **giao cho một nhóm hoặc cá nhân thực hiện có thời gian, ngân sách, nguồn lực và tiêu chí hoàn thành riêng**.



# Work Package

## Đặc điểm của Work Package:

- Có thể giao cho một nhóm người thực hiện.
- Thời gian thực hiện thường từ 8 - 80 giờ làm việc.
- Có thể ước tính chi phí, tiến độ và tài nguyên riêng biệt.
- Có đầu vào & đầu ra rõ ràng (ví dụ: "Giao diện đăng ký học viên đã hoàn thành").

**Tên Work Package:** Thiết kế giao diện trang quản lý học viên

**Mã số WBS:** 1.1.3.2

**Mô tả công việc:**

- ✓ Thiết kế giao diện quản lý danh sách học viên theo tiêu chí UX/UI.
- ✓ Đảm bảo hệ thống hỗ trợ tìm kiếm học viên theo mã, tên, lớp học.
- ✓ Thiết kế responsive, hỗ trợ máy tính & điện thoại.

**Đầu vào:**

- ✓ Yêu cầu thiết kế từ tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- ✓ Logo, bộ nhận diện thương hiệu của trung tâm đào tạo.

**Tiêu chí hoàn thành:**

- ✓ Giao diện hoàn thiện theo thiết kế UX/UI.
- ✓ Được phê duyệt bởi Product Owner & Tester.

**Thời gian thực hiện:** 5 ngày (2 designer + 1 UX/UI chuyên gia).

**Rủi ro tiềm ẩn:**

- ✓ Feedback từ giảng viên hoặc học viên có thể yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần.
- ✓ Có thể tốn thời gian nếu thay đổi thiết kế theo yêu cầu Stakeholders.

**Người phụ trách:** Designer Nguyễn Văn A, Tester Trần Thị B.
